




CQ Dupleix/La Motte-Picquet

Travaux de voirie et de végétalisation

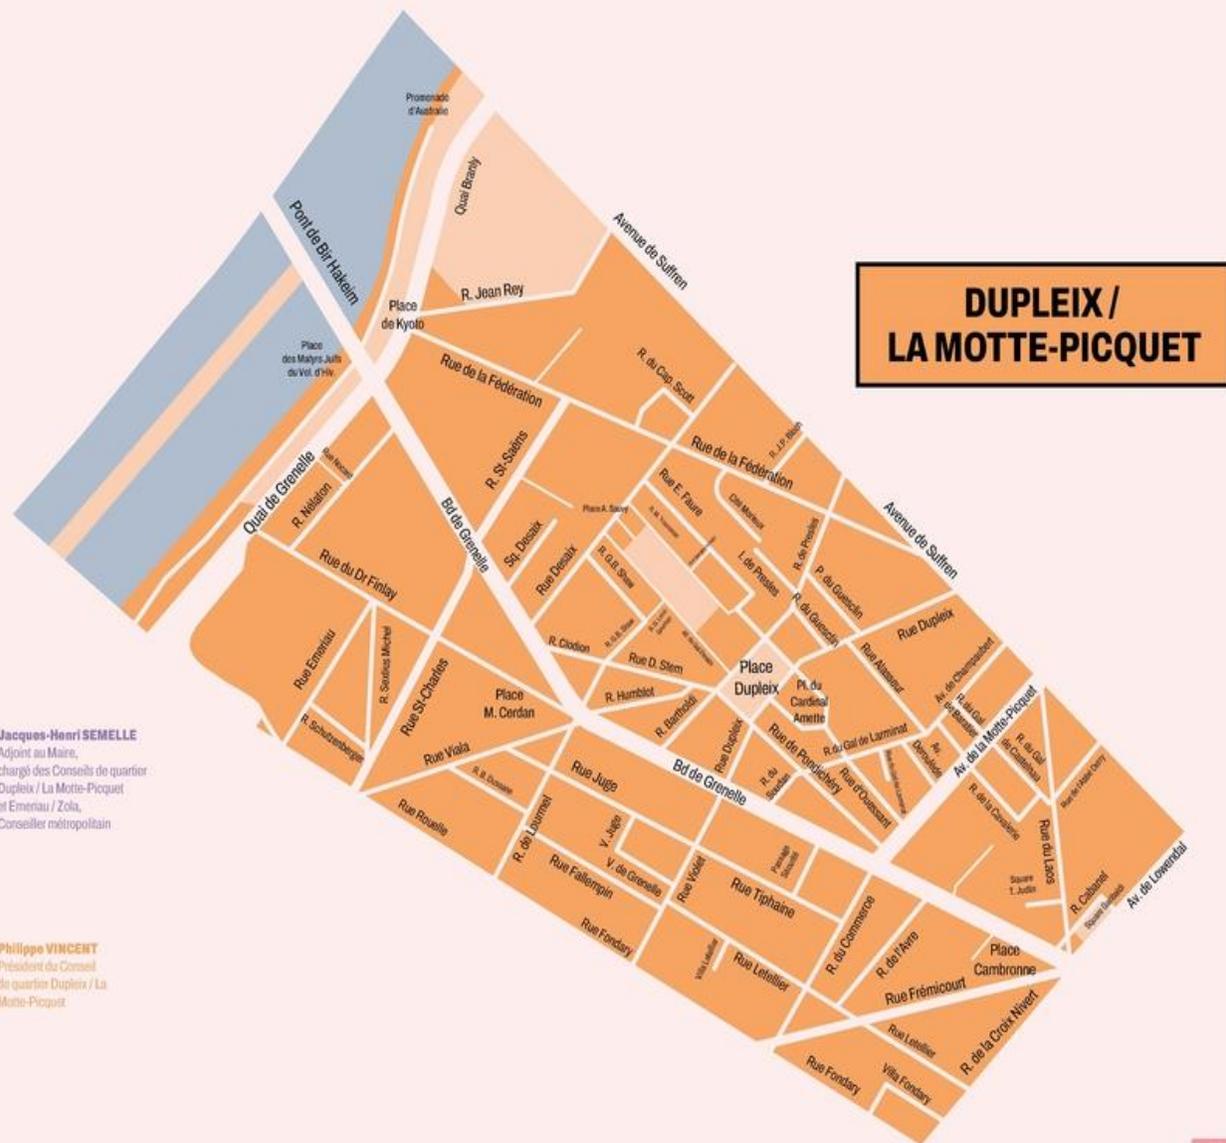

Jacques-Henri SEMELLE
Adjoint au Maire,
chargé des Conseils de quartier
Duplex / La Motte-Picquet
et Emeriau / Zola,
Conseiller métropolitain



Philippe VINCENT
Président du Conseil
de quartier Duplex / La
Motte-Picquet



Sommaire

01 Travaux Ville de
Paris – DVD / STV

02 Autres Travaux
Ville de Paris

03 Travaux DEVE

01

Travaux Ville de Paris
DVD/STV

Ile aux Cygnes : travaux terminés à ce jour hors EP

Aménagement de l'Ile aux Cygnes			
12-mars-25			
Nature des interventions	Statut/Calendrier	Commentaires STV Août 2024	Commentaires STV Mars 2025
Réfection du cheminement central	Travaux terminés depuis fin Septembre 2024	Travaux terminés depuis fin Septembre 2025	Travaux terminés depuis fin Septembre 2024
Rénovation des bancs existants avec création des plateformes d'accessibilité PMR	Du 05 Août au 05 Octobre 2024	Retard dû à la défaillance d'un sous- traitant	Travaux terminés
Réfection des escaliers en pierre naturelle	Travaux de réfection terminés depuis Juin 2024	Reprise de joints à prévoir en Septembre 2024	Travaux terminés
Changement des garde-corps	Travaux terminés depuis Juillet 2024	Contraintes budgétaires : choix d'un remplacement partiel des garde-corps les plus problématiques en matière de sécurité. Aujourd'hui, nous avons sécurisé l'intégralité des garde-corps implantés sur cette île et il n'y aura pas d'autres.	Travaux terminés
Peinture de candélabres	Reporté post mandature	L'ensemble des candélabres vétustes fera l'objet d'un remplacement	Travaux à programmer post-mandature
Plantations de dix à quinze arbres	Travaux terminés depuis Mars 2024	Plantation de 12 arbres	Travaux Terminés



Place de Brazzaville

- ❑ Coût des travaux : plus de 500 k€
- ❑ Travaux du 21 Octobre au 1er Août 2025 en cas d'aléas
- ❑ Plantation de 4 nouveaux arbres et d'une jardinière plantée
- ❑ Création d'un parvis piéton

VILLE DE PARIS | **MAIRE DU 15 PARIS**

TRAVAUX PLACE DE BRAZZAVILLE

Dans le cadre de la démarche « Embellir votre quartier », vous avez fait part de vos nombreuses idées pour améliorer et rendre plus agréables les espaces de votre quotidien.

Quoi ?
Aménagement et végétalisation

Où ?
Place de Brazzaville

Quand ?
Du 21 octobre 2024 au 1er août 2025

Comment ?

- ▲ Création d'un parvis piéton côté square en élargissant le trottoir.
- ▲ Réfection (mise en place d'un tapis végétal) et agrandissement des pieds d'arbres existants.
- ▲ Plantations de quatre nouveaux arbres sur le parvis.
- ▲ Agrandissement du square Belà Bratók avec la création d'une jardinière en pleine terre.
- ▲ Mise en place d'asphalte de couleur clair sur le parvis.
- ▲ Déplacement et remplacement de deux candélabres vétustes et remplacement des câbles électriques.
- ▲ Recalibrage des voies de circulation et création d'un itinéraire cyclable à double-sens de circulation autour de la place.
- ▲ Agrandissement des trottoirs du côté de la rue Rouelle.

Les impacts

Pendant toute la durée du chantier :

- ▲ La voie sera ponctuellement fermée à circulation
- ▲ Stationnement interdit sur la place de Brazzaville entre les n°10 à 14 et entre les n°15 à 19.
- ▲ Maintien de la circulation des véhicules de secours.

Contacts

RÉALISATION
VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
SECTION TERRITORIALE DE VOIRIE – SUD OUEST
17, RUE CAUCHY, PARIS 15^E
TEL. 01 53 98 21 50



ENTREPRISES
EUROMIA, AGILIS, CIELIS, FAYOLLE, LINEA TP, BOUYGUES
ENERGIES, ENEDIS

Plus d'infos sur paris.fr/chantiers et au 3975* *0207 D'UN APPEL LOCAL

PATIENCE ON EMBELLIT VOTRE QUARTIER

Conception et impression : Ville de Paris


Place de Brazzaville : État actuel /État projeté

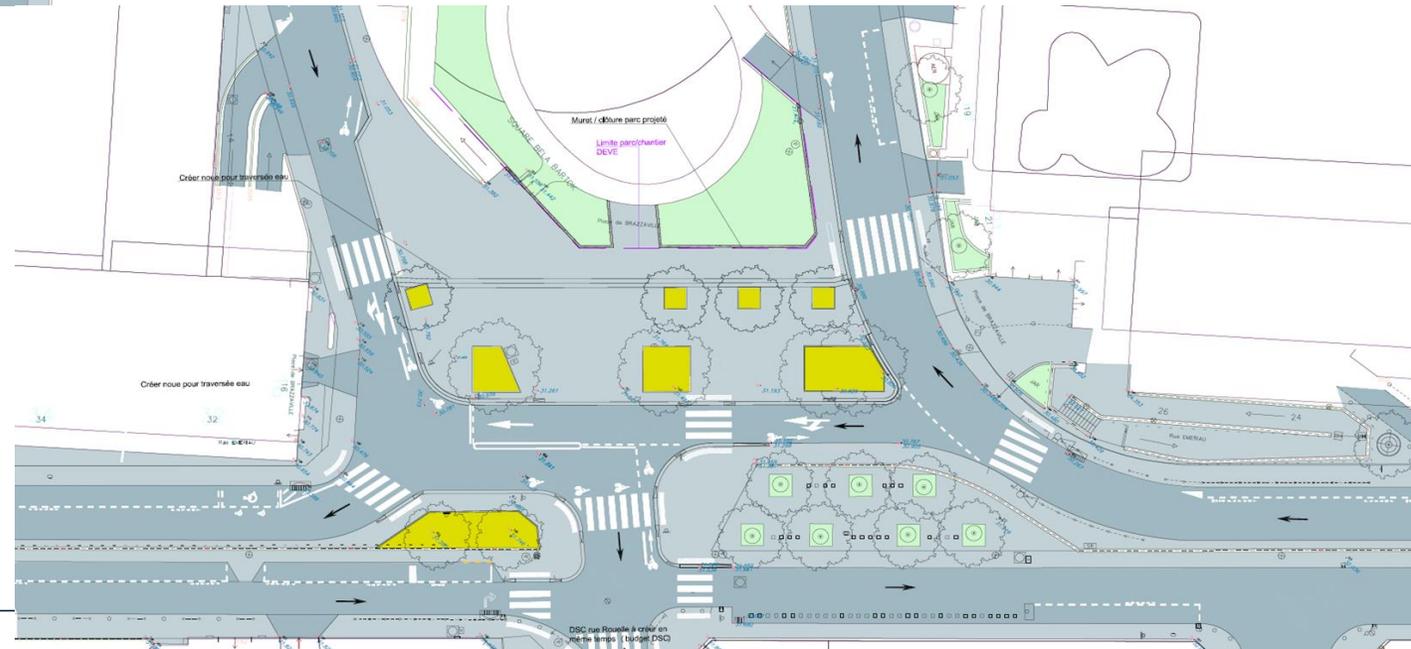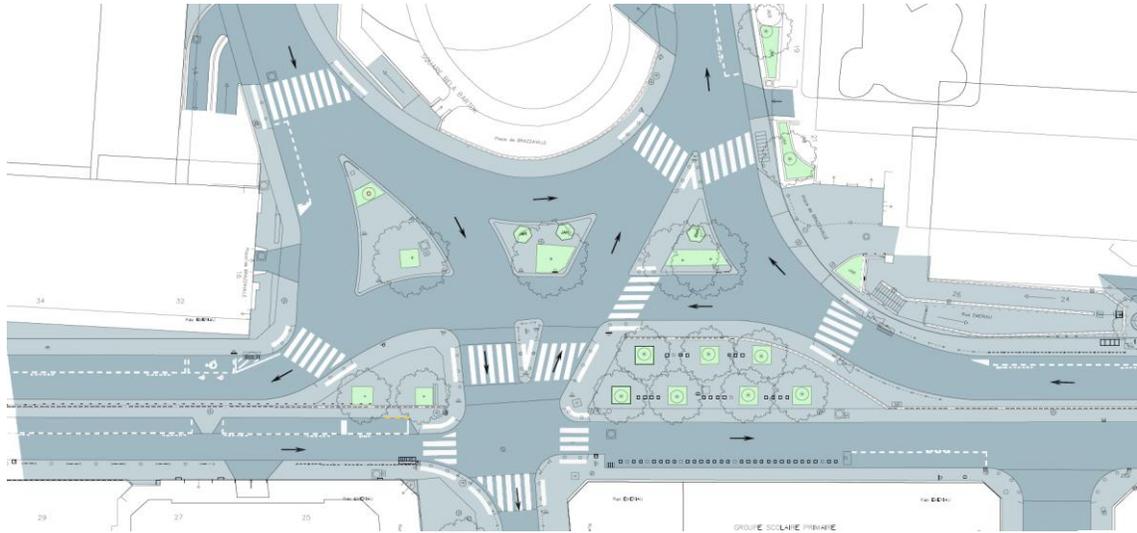

Place de Brazzaville : Focus sur les plantations



Photo non contractuelle

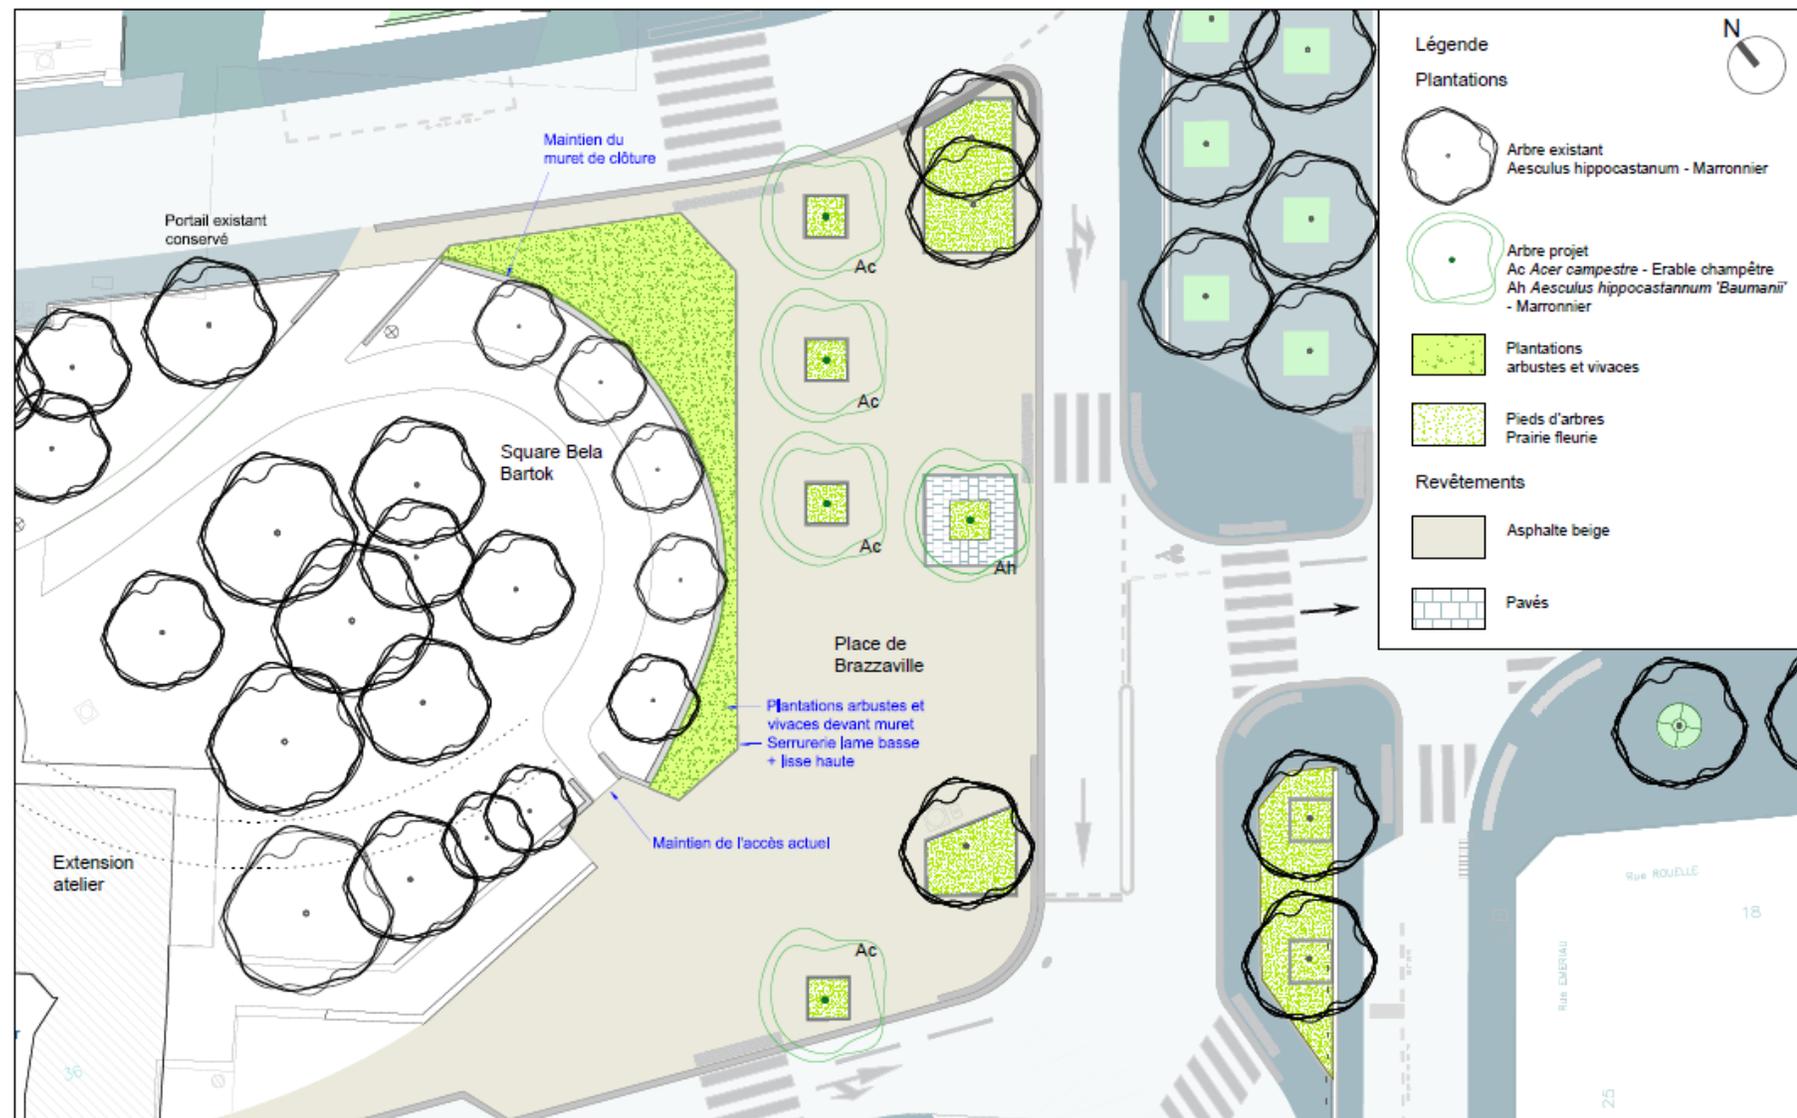

Place de Brazzaville – avant travaux/ En cours de travaux



02

Autres Travaux Ville de Paris

Travaux Ville de Paris – DVD- SAGP

Aménagement de la rue de la croix-Nivert

Date de travaux : Du 6/01 au 31/12/25

Tronçon aménagé : de Cambronne à Convention

Présentation par Alain Boulanger


03 Travaux DEVE



**Prolongement de la
coulée verte
Beaugrenelle : 4^{ème}
phase
d'aménagement**



Pour rappel, le plan de l'existant

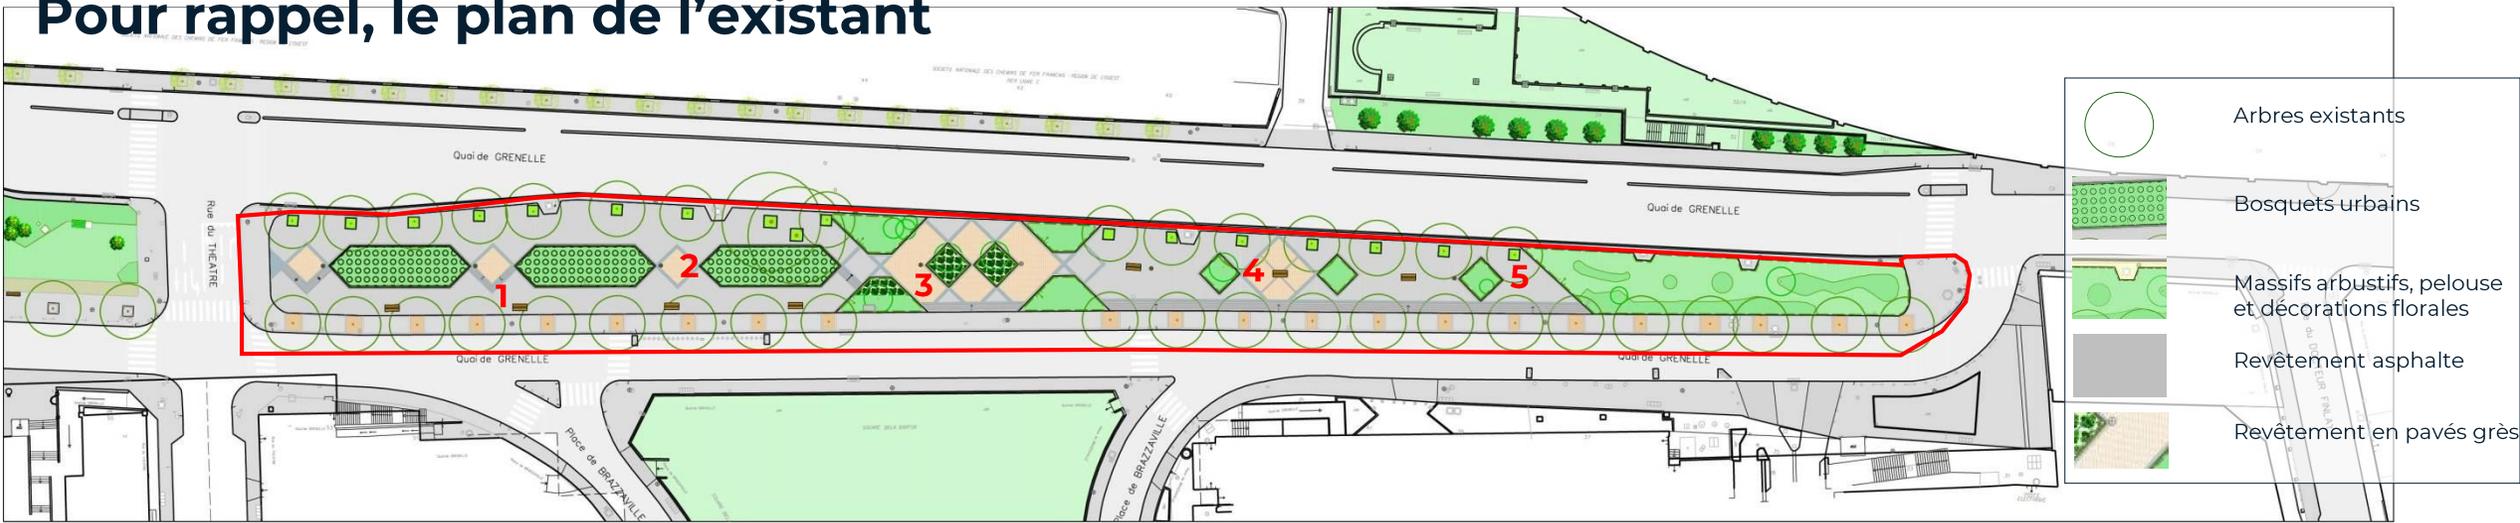


□ Périmètre projet de 4 450 m²



Un espace public aux matériaux vieillissants, des réseaux (éclairage et arrosage) à rénover, des masses végétales à repenser

La 4^{ème} phase de la coulée verte Beaugrenelle

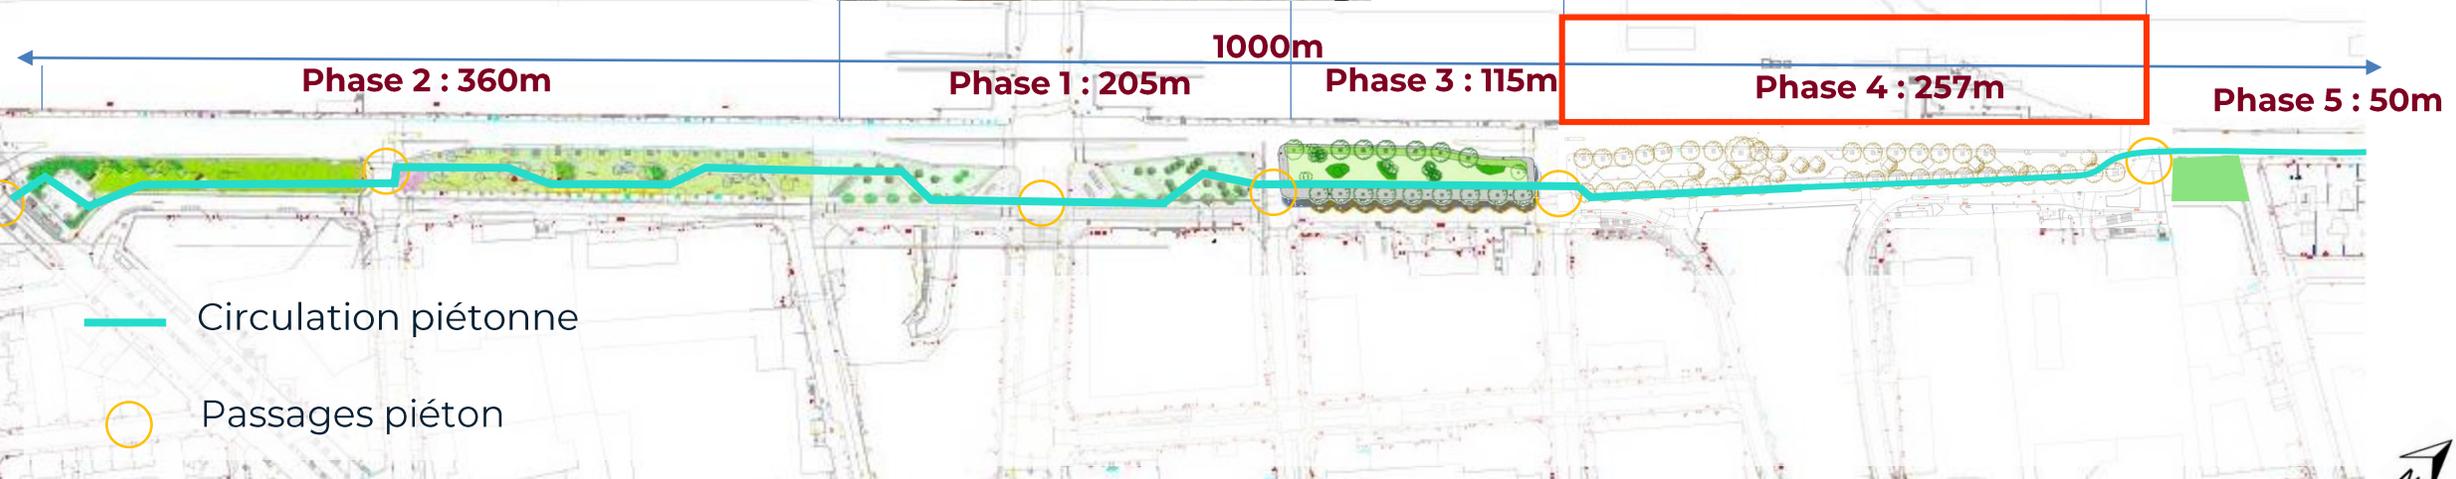

- Une 5^{ème} et dernière phase restera à réaliser avec la requalification du parvis devant l'ex garage Renault une fois les travaux de reconversion du bâtiment terminés.

Point d'avancement sur les travaux en cours


- Le chantier a démarré en octobre 2024 selon une première phase de travaux (démolition, terrassement)
- Le 13 janvier 2025, une seconde phase de chantier a démarré pour réaliser le recalibrage du terre-plein
- Les travaux de plantation et d'arrosage sont en cours de finalisation
- Les travaux d'infrastructure se poursuivent jusqu'à mi-mai 2025 :
 - Réalisation de l'emmarchement
 - Pose des dalles granit sur la placette
 - Réalisation des enrobés au droit de l'allée créée sur la chaussée de la contre-allée
 - Réalisation des revêtements des allées en stabilisé et asphalte clair
 - Réalisation du marquage définitif et pose du mobilier
- **Livraison prévisionnelle de l'aménagement mi-mai 2025**

Coût des travaux : 1 400 000 €

Financement : Budget participatif 2021 et reliquats des Budget participatifs précédents



Poursuivre la promenade de la Coulée verte Beaugrenelle : Perspectives

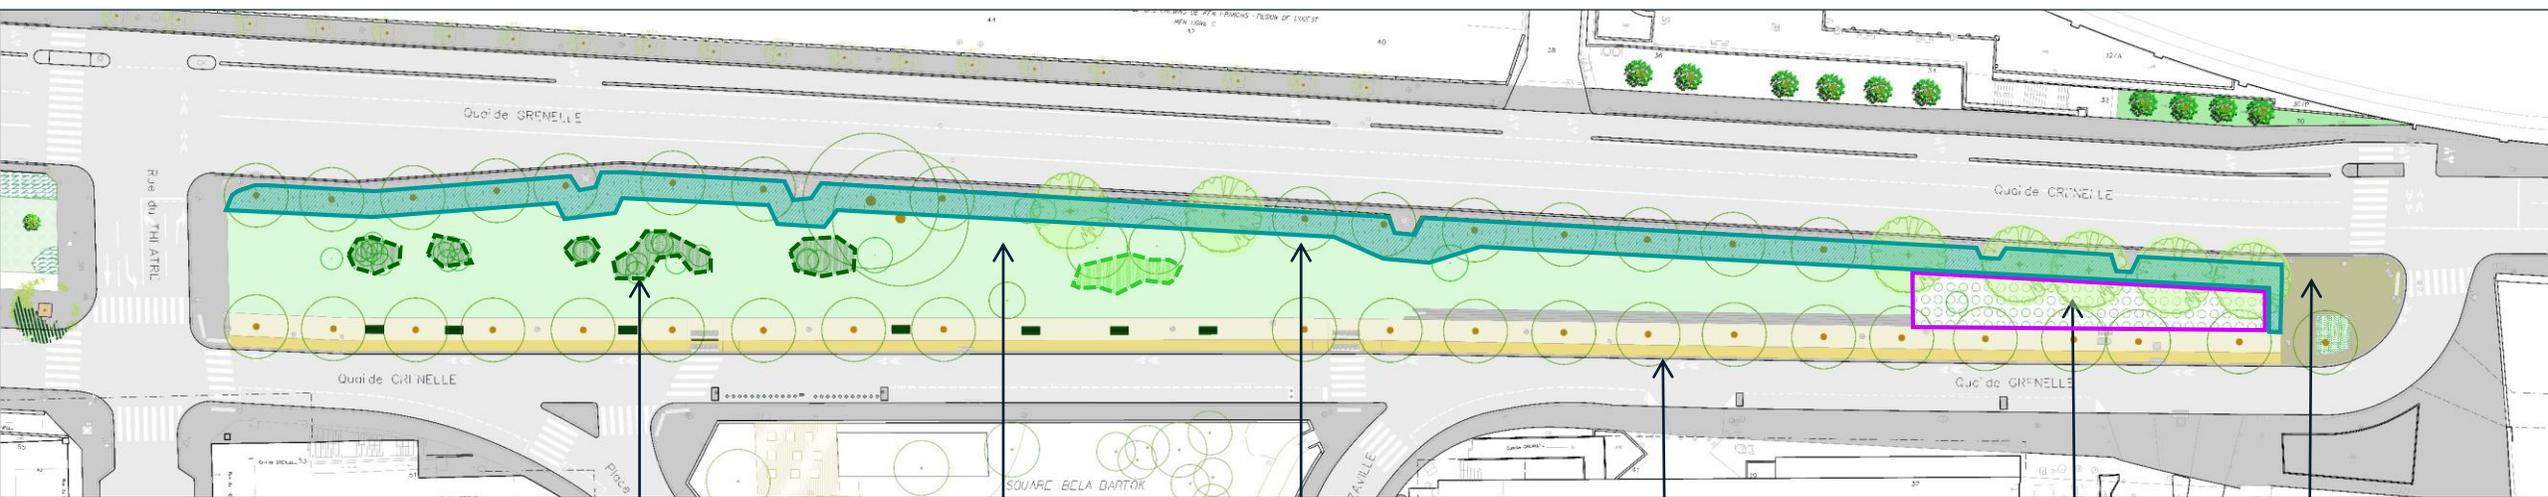

-  Dalles granit
-  Stabilisé
-  Pavés (escalier)
-  Allée en asphalte clair
-  Ourlet d'arbustes et vivaces
-  Pelouse
-  Vivaces sous arbustes existants
-  Massifs arbustes et vivaces
-  Bosquet Miyawaki
-  Nouvelles plantations d'arbres (Marronnier à fleurs rouges)
-  Arbres existants

④ Ilots verts plantés de cépées, arbustes et vivaces comme en phase 3

③ Large pelouse accessible

② Haie pour mettre à distance la circulation des quais, comme en phase 3


① Suppression de la file de stationnement pour créer l'allée piétonne continue

⑤ Placette en dalles granit en amorce de la phase 5

⑥ Bosquet Miyawaki

→ Surface végétalisée créée : 1 896 m²
→ Plantation de 7 arbres

Poursuivre la promenade de la Coulée verte Beaugrenelle : Résultat attendu





Merci
