CHANTIER OUDINOT / Batiment HABITATIONS

PLANNING OPERATIONNEL

11/09/2023

TASK DESCRIPTION	Intervenants	PLAN START	PLAN END	TYPE
GROS ŒUVRE	**PROLOGIS**	11/09/2023	24/08/2024	bl
PLANCHERS		11/09/2023	27/11/2023	
FACADES		11/09/2023	18/12/2023	
CHARPENTE		13/11/2023	20/01/2024	
COUVERTURE		20/01/2024	01/04/2024	
BASSIN + VRD BASSIN		20/10/2023	20/12/2023	
MACONNERIE	**PROLOGIS**	01/12/2024	22/04/2024	bl1
CLOISON + ENDUITS		01/12/2024	22/04/2024	
CHAPES AUTOLISSANTES		05/02/2024	01/04/2024	
PLATRERIE / ISOLATION	**Non Défini**	01/04/2024	27/05/2024	bl2
ISOLATION		01/04/2024	27/05/2024	
DOUBLAGES		29/04/2024	27/05/2024	
MEUISERIES EXT BOIS	**PRODECOR**	19/02/2024	22/04/2024	v
FENETRES + VOLETS		19/02/2024	22/04/2024	v
MENUISERIES EXT ACIER	**VILET**	01/01/2024	29/04/2024	vi
GARDE-CORPS		08/04/2024	29/04/2024	vi
MARQUISE BAT;RUE		04/03/2024	25/03/2024	vi
VERRIERE		01/01/2024	24/01/2024	vi
RAVALEMENT	**BATI RENOV**	08/04/2024	15/06/2024	j
FACADE RUE BAT, RUE		08/04/2024	15/06/2024	j
FACADE COUR+ EXTENTION BAT.RUE		08/04/2024	15/06/2024	j
ELECTRICITE	**JETRELEC**	18/09/2023	17/03/2025	r
PASSAGE DES RESEAUX		01/01/2024	01/04/2024	r
POSE DES EQUIPEMENTS		01/01/2025	17/03/2025	r
PLOMBERIE CVC	**BALAS**	11/09/2023	17/03/2025	gr
PASSAGE DES RESEAUX		11/09/2023	15/12/2023	gr
PLANCHERS CHAUFFANTS		29/04/2024	01/08/2024	gr
POSE DES EQUIPEMENTS		01/01/2025	17/03/2025	gr
BASSIN ,PAC &PLANCHER AMOVIBLE	**PAM PISCINES**	25/09/2023	15/06/2024	m
L.T.DESHU		01/12/2023	20/02/2024	m
PLANCHER AMOVIBLE		15/04/2024	15/06/2024	m
LOTS AMB		02/09/2024	28/04/2025	or
MARBRERIE	ILDEI	02/09/2024	16/12/2024	b
AGENCEUR/ SERRURERIE	BIDET	02/09/2024	28/04/2025	r
PARQUET	DINES	04/11/2025	20/01/2025	m
PEINTURE	ND	02/12/2024	28/04/2025	vi

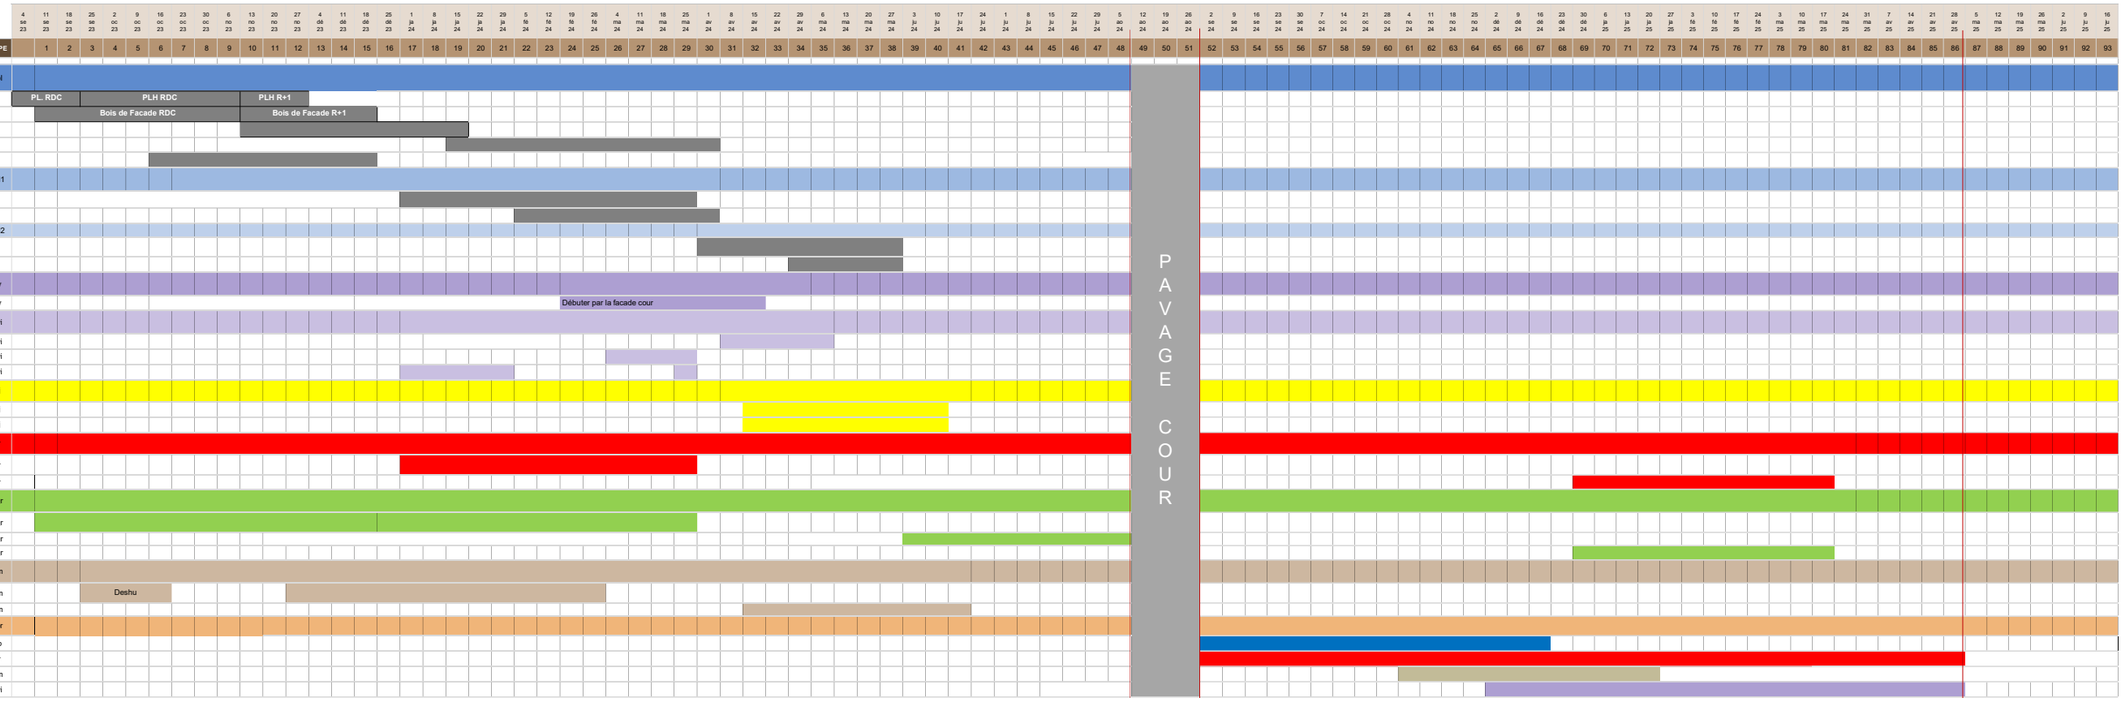

Construction Schedule Template © 2017 by Vertex42.com
